

Справка о проведенной работе по вопросу «Реконструкция ЛЭП в НСТ «Надежда» по состоянию на 12.10.2018 года

1. Проведенные работы:

По состоянию на 12.10.2018 года сбор целевого взноса:

1. в размере 2300 рублей составил -1 279 438 рублей, из начисленных 1428300 рублей, задолженность составляет 148562 рублей,
2. В размере 5000 рублей составил – 2 051 089 рублей, из начисленных 3 100 000 рублей, задолженность составляет 1 048 910 рублей,
Общая задолженность составляет 1 197 472 рубля.

28.11.2017 года с ООО «РОСЭНЕРГОКОМПАНИЯ» был заключен договор № 28.11.17 на выполнение следующих работ по получению для Заказчика новых технических условий ОАО «РЭС» по объекту, согласно расчету нагрузок (максимальная мощность 146 кВт) от ПС 110/ кВ «Мост».

Стоимость работ по Договору составила **1 565 000** рублей. Порядок расчета за выполненные работы Исполнителем установлен:

- аванс в размере 765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей руб. выплачивается Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора;

- 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп. – в течение 2 (двух рабочих дней с момента получения новых технических условий ОАО «РЭС» по объекту Заказчика;

- 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп. оплачивается Заказчиком сроком до 01.07.2018 года включительно.

Первый взнос в размере 765 000 рублей был перечислен в компанию.

12.12.2017 года было получено «Согласие от ДНТ «Север» о согласовании точки подключения - Приложение №1 к настоящему документам.

30.01.2018 года была подана заявка в РЭС, однако затяжной характер согласования связан с предоставлением дополнительной документации.

17.04.2018 года заключен Договор на выполнения проектных работ №11-18. Сумма договора 273 000 рублей.

Разрабатываемый проект предполагает два раздела.

1. Раздел – ЛЭП от точки подключения до новой ТП (160 кВа) с подключением сектора «А», примерное количество абонентов 328, предполагается предусмотреть три фидера, на которые будут подключены следующие улицы:

Фидер №1 -37 улица;

Фидер №2 – с 7 по 12 и 36 улицы;

Фидер №3 – с 24 по 35 улицу.

2. Раздел – ЛЭП от новой ТП до существующей с подключением сектора «В», примерное количество абонентов 545. К ней подключаются улицы с 1 по 6, с 13 по 23, 38 и 36 (12 абонентов)+250 будущих абонентов на земельном участке 4 Га.

20.08.2018 года РЭС согласовано технологическое подключение (мощность 5кВт).

В настоящий момент подана заявка на увеличение мощности до 146 кВт. После ее согласования будет выдано ТУ - ориентировочный срок 01.11.2018 года.

После выдачи ТУ, на согласование будет передан проект линии, (1 этап), однако работы по монтажу можно вести уже сейчас, подрядчик гарантирует отсутствие существенных изменений в проект на этапе согласования.

10.10.2018 года подрядчиком ООО «Новая Энергия» представлен договор на выполнение подрядных работ -1 этап (установка ТП, подключение улиц №7-12, 36,37) на общую сумму 2 868 412 рублей (работы под ключ).

Таким образом, для начала работ по монтажу 1 этапа линии, необходимо:

2 868 412 рублей (стоимость стройки 1 этап)+800 000(оплата за согласование точки подключения и мощности)+73 000 (оплата проекта 1 этап)=3 741 412 рублей.

С учетом произведенной частичной оплаты за согласование и проект (765000+100000)-остаток собранного целевого взноса составляет **2 465 527** рублей.

Разница $3\,741\,412 - 2\,465\,527 = 1\,275\,885$ рублей.

Председатель правления  Матин Е.В.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

630005, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 80, тел. (383) 289-45-60, факс (383) 224-60-08, e-mail: info@eseti.ru
Получатель: АО "РЭС" р/счет 40702810703290002638 в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
к/счет 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России, ИНН 5406291470, КПП 546050001, БИК 045004783

Председателю НСТ «Надежда»
Е.В. Матину
633168, Новосибирская область,
Колыванский район, с. Соколово

Председателю ДНТ «Север»
Н.А. Москаленко
630133, г. Новосибирск,
ул. В. Высоцкого, д.9, кв.203

26.04.2018 № 19-22/150368
На № б/н от 05.04.2018

*О ничтожности соглашения о
перераспределении мощности в рамках
опосредованного присоединения*

В ответ на Ваше обращение (вх. № 53-150368 от 05.04.2018) АО «РЭС» сообщает следующее.

Согласно императивной норме п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Под однократностью технологического присоединения понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

В отношении энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» осуществлена процедура технологического присоединения.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» осуществлено к сетям иной сетевой организации - ОАО «ОЭК».

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 - далее Правила).

Снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев возможно только в пределах действия одного центра питания (п.34 Правил).

НСТ «Надежда» и ДНТ «Север» представлено уведомление об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» (место нахождения:

Новосибирская область, Кольванский район МО Соколовский сельсовет) через объекты электросетевого хозяйства ДНТ «Север».

Поскольку технологическое присоединение энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» осуществлено от сетей ОАО «ОЭК», осуществление повторного присоединения энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» от сетей АО «РЭС» противоречит императивным положениям действующего законодательства.

В свою очередь, технологическое присоединение энергопринимающих устройств ДНТ «Север» осуществлено от сетей АО «РЭС».

В связи с чем ДНТ «Север» не вправе перераспределить в рамках опосредованного присоединения свою мощность, разрешенную от сетей АО «РЭС», в пользу НСТ «Надежда», технологическое присоединение объектов которого осуществлено от сетей иной сетевой организации ОАО «ОЭК».

Существующие схемы электроснабжения ДНТ «Север» и НСТ «Надежда» не позволяют осуществить опосредованное присоединение энергопринимающих устройств НСТ «Надежда» посредством перераспределения снижаемой ДНТ «Север» мощности.

АО «РЭС» обращает внимание, что п.40(4)-40(10) Правил определяют только особенности присоединения посредством перераспределения в рамках опосредованного присоединения.

При этом в остальной части (в том числе, в части требований о расстоянии до объектов электросетевого хозяйства ближайшей сетевой организации, необходимости присоединения энергопринимающих устройств садоводческого объединения с использованием инфраструктуры такого объединения, необходимости перераспределения мощности в пределах одного центра питания) при заключении сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности должны соблюдаться императивные положения Правил.

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется (п.2(2) Правил).

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (п.2(2) Правил).

Таким образом, в силу принципа однократности технологического присоединения и императивных положений п.2(2) Правил в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих НСТ «Надежда» и его членам, технологическое присоединение может быть осуществлено только с использованием объектов электросетевого хозяйства НСТ «Надежда», присоединенных к сетям ОАО «ОЭК», путем увеличения мощности в существующей точке присоединения.

При этом для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя (п.8 Правил).

На наименьшем расстоянии от границ участка НСТ «Надежда» расположены объекты электросетевого хозяйства ОАО «ОЭК».

Поскольку ближайшими по отношению к границам участка НСТ «Надежда» являются сети ОАО «ОЭК», технологическое присоединение энергопринимающих

устройств НСТ «Надежда» осуществлено к сетям сетевой организации ОАО «ОЭК», при намерении присоединить дополнительную нагрузку и увеличить мощность НСТ «Надежда» необходимо обратиться в сетевую организацию ОАО «ОЭК».

Наряду с этим, в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, является совместной собственностью его членов (п.1 ст.4 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях»).

Величина мощности, разрешенной для электроснабжения энергопринимающих устройств ДНТ «Север», а также соответствующие объекты электросетевого хозяйства являются общей собственностью членов ДНТ «Север».

Согласно пп.10 п.6.2 Устава ДНТ «Север» к исключительной компетенции общего собрания членов ДНТ «Север» относится, в частности, принятие решений об использовании имущества ДНТ «Север».

При этом ДНТ «Север» не представлен документ (копия протокола или выписка из протокола общего собрания членов ДНТ «Север»), подтверждающий принятие общим собранием членов ДНТ «Север» решения о снижении принадлежащей членам ДНТ «Север» мощности и ее перераспределении в пользу НСТ «Надежда».

ДНТ «Север» не представлен документ, подтверждающий принятие общим собранием членов ДНТ «Север» решения о возможности использования объектов электросетевого хозяйства, составляющих общее имущество членов ДНТ «Север», в целях осуществления опосредованного присоединения НСТ «Надежда».

Таким образом, в представленном соглашении о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения от 23.03.2018 ДНТ «Север» и НСТ «Надежда» достигнуто соглашение в отношении имущества, принадлежащего иным лицам (членам ДНТ «Север»).

В связи с чем соглашение о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения от 23.03.2018 затрагивает права и законные интересы членов ДНТ «Север».

На основании изложенного, представленное НСТ «Надежда» и ДНТ «Север» соглашение о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения противоречит императивным нормам п.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п.2(2), п.8, п.34 Правил, посягает на публичные интересы, а также права и охраняемые законом интересы третьих лиц (в частности, членов ДНТ «Север»), как следствие, является ничтожным на основании п.2 ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п.1 ст.167 ГК РФ).

Поскольку представленное НСТ «Надежда» и ДНТ «Север» уведомление об опосредованном присоединении и соглашение о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения от 23.03.2018 ничтожны и не влекут юридических последствий, у АО «РЭС» отсутствуют основания для согласования опосредованного присоединения.

При намерении увеличить мощность НСТ «Надежда» необходимо обратиться в сетевую организацию ОАО «ОЭК», к сетям которой присоединены объекты НСТ «Надежда».

Директор по технологическим присоединениям



А.И. Хоруженко



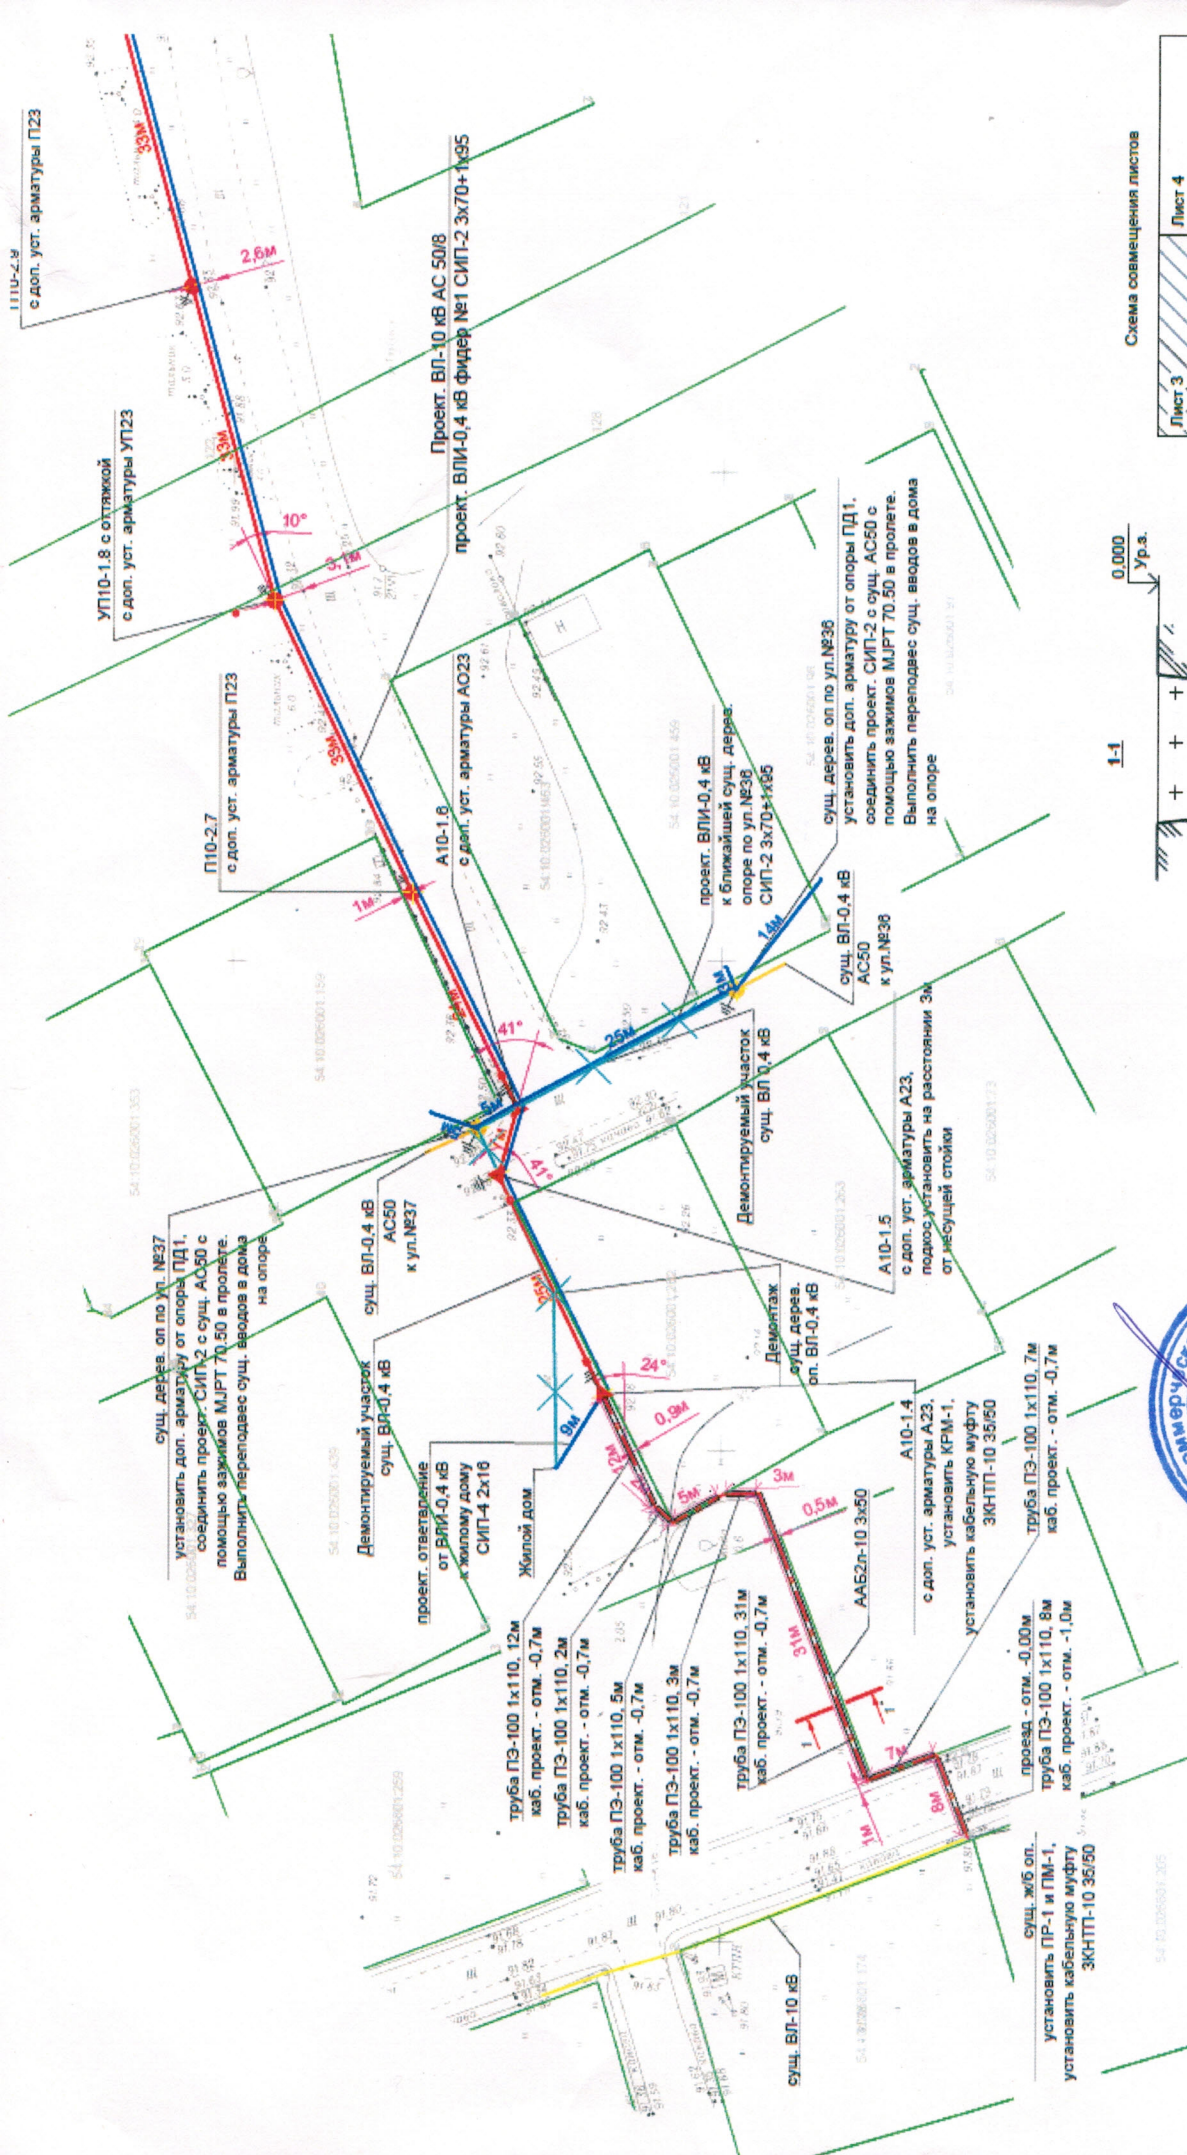


Схема совмещения листов

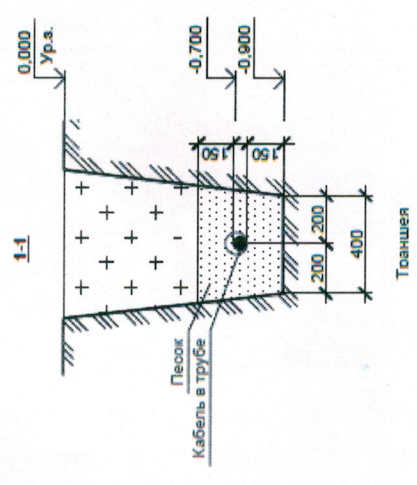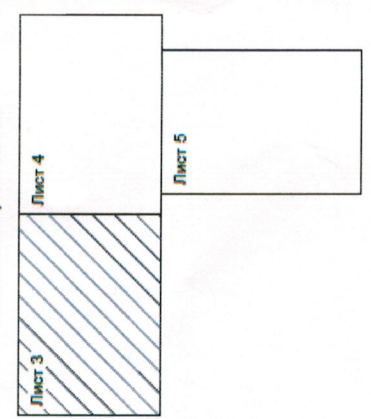

Согласовано *Матин С.В.*

Договор № 09-18/СМР
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Новосибирск

«10» октября 2018 года

Некоммерческое садоводческое товарищество «Надежда» (далее - НСТ «Надежда»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Председателя правления Матина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергия» (далее - ООО «Новая Энергия»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора Чикунова Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего договора по поручению Заказчика выполнить *строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте: «ЛЭП-10 кВ, МТП 10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4т кВ» по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, кадастровый номер земельного участка 54:10:026001:1* (далее-объект), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

Наименование, виды и объем выполняемых работ определяются согласованной в установленном порядке обеими сторонами сметной документацией (Приложения №№ 1, 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, производятся силами Подрядчика и из его материалов.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ составляет *2 868 412 (Два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 59 копеек*, без НДС, согласно Локальным сметным расчетам №№1, 2 (Приложения № № 1, 2 к настоящему договору).

2.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и возникающие в процессе производства Подрядчиком работ, выполняются на основании технического задания Заказчика, с оформлением дополнительного соглашения в письменной форме с гарантией оплаты. Стоимость этих работ, сроки их выполнения и порядок оплаты определяются в соответствии с условиями дополнительного соглашения к настоящему договору на основании смет, утвержденных Сторонами.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ – «24» октября 2018 года, но не ранее исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 6.2.1 – 6.2.2. настоящего договора;
- окончание выполнения всех работ – «07» декабря 2018 года.

Срок окончания выполнения работ изменяется соразмерно количеству дней просрочки исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.2.1-6.2.2 настоящего договора и иных обязательств Заказчика, предусмотренных настоящим договором, и не требует письменного оформления дополнительного соглашения.

3.2. Сроки начала и окончания работ также могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Датой окончания работ по настоящему договору является дата направления Заказчику акта выполненных работ формы №КС-2 и справки формы №КС-3. Датой принятия выполненных Подрядчиком работ является дата подписания данных документов Заказчиком.

3.4. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ формы №КС-2 и справки формы №КС-3 предоставить Заказчику счета-фактуры,

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___" 2014 г.

___ "___" 2014 г.

НСО, Кольванский район, кадастровый номер земельного участка 54:10:026001:1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на ЛЭП-10 кВ на объекте: СНТ "Надежда"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 452 882,79 руб.
Средства на оплату труда 320 351,46 руб.
Сметная трудоемкость 1 407,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ.											
Установка опор											
1	ФЕР33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (шт)	11	3935,43 1546,52	1946,63 404,37		43289,73	17011,72	21412,93 4448,07	9,591	105,5
2	ФЕР33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт)	15	7518,94 2775,95	4300,7 870,27		112784,1	41639,25	64510,5 13054,05	17,2155	258,23

3	ФЕР33-04-003-06	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами (шт)	1	11778,74 4209,13	7127,32 1431,3	11778,74	4209,13	7127,32 1431,30	26,4615	26,46
4	ФЕР33-04-005-02	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (шт)	2	457,65 385,53	69 26,12	915,3	771,06	138 52,24	2,484	4,97
5	ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт)	44	624,29 90,17	534,12 162,75	27468,76	3967,48	23501,28 7161,00	0,6072	26,72
6	ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы оснастки одностоечных опор (шт)	11	179,78 51,24	128,54 47,47	1977,58	563,64	1413,94 522,17	0,345	3,8
7	ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалы оснастки сложных опор (шт)	16	208,4 61,53	146,87 54,25	3334,4	984,48	2349,92 868,00	0,414	6,62
Заземление опор ВЛ-10кВ 25 опор										
8	ФЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт)	50	1494,72 172,04	1321 154,21	74736	8602	66050 7710,50	1,1178	55,89
9	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)	0,375	30169,34 30169,34		11313,5	11313,5		212,52	79,7
10	ФЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (100 м)	2,5	7691,5 4485,72	586,43 88,16	19228,75	11214,3	1466,08 220,40	26,22	65,55
11	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3)	0,375	16670,75 16670,75		6251,53	6251,53		122,13	45,8
Заземление опоры с разьединителем 3 шт										
12	ФЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт)	3	1494,72 172,04	1321 154,21	4484,16	516,12	3963 462,63	1,1178	3,35
13	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0585	30169,34 30169,34		1764,91	1764,91		212,52	12,43
14	ФЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (100 м)	0,456	7691,5 4485,72	586,43 88,16	3507,32	2045,49	267,41 40,20	26,22	11,96

15	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3)	0,0585	16670,75 16670,75		975,24	975,24	122,13	7,14
Установка разьединителей и разрядников									
16	ФЕР33-04-030-03	Установка разьединителей: с помощью механизмов (компл.)	3	3233,59 2044,19	1177,4 343,34	9700,77	6132,57	3532,2 1030,02	11,1642
17	ФЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов (компл.)	6	2070,31 954,66	1099,88 309,18	12421,86	5727,96	6599,28 1855,08	5,9202
Установка пункта коммерческого учета									
18	ФЕР33-04-031-03	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ (компл.)	1	17044,08 6907,9	10136,18 2782,6	17044,08	6907,9	10136,18 2782,60	39,4542
Монтаж устройства отвлечения УОК									
19	ФЕРм08-02-305-04	Траверса на опоре (шт)	1	291 94,44	196,14 50,99	291	94,44	196,14 50,99	0,5658
Монтаж провода									
20	ФЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км)	0,377333	38851,29 13669,63	23004,96 7141,23	14659,87	5158	8680,53 2694,62	78,9774
Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ.								666509,3	852,95
Раздел 2. Строительство КЛ-10 кВ									
Траншея Т-3									
21	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,2628	33149,35 33149,35		8711,65	8711,65	217,35	57,12
22	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3)	0,1752	13892,29 13892,29		2433,93	2433,93	101,775	17,83
23	ФССЦп-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	14,892	33,5	33,5	498,88		498,88	
24	ФССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузопольностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза)	14,892	113,19	113,19	1685,63		1685,63	
Монтажные работы									

25	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м)	0,73	3565,96 1067,22	2493,25 946,87	2603,15	779,07	1820,07 691,22	6,095	4,45
26	ФЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м)	0,05	4045,28 1049,01	2990,89 908,99	202,26	52,45	149,54 45,45	5,9915	0,3
27	ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м)	0,07	4435,45 2309,42	1730,01 493,74	310,48	161,66	121,1 34,56	13,1905	0,92
28	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м)	0,68	4489,78 3759,24	519,43 105,07	3053,05	2556,28	353,21 71,45	21,4705	14,6
29	ФЕРм08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м)	0,2	5376,88 4631,08	545,02 105,07	1075,38	926,22	109 21,01	26,4512	5,29
Прокладка труб										
30	ФЕР22-01-021-04	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм (км)	0,068	89771,47 53229,8	36366,71 9875,19	6104,46	3619,63	2472,94 671,51	314,824	21,41
Уплотнение кабеля в трубах										
31	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт)	14	93,01 76,6		1302,14	1072,4		0,437	6,12
Монтаж концевых муфт 10 кВ										
32	ФЕРм08-02-165-06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (шт)	2	6908,93 1071,2	5820,57 1186,52	13817,86	2142,4	11641,14 2373,04	6,118	12,24
Итого по разделу 2 Строительство КЛ-10 кВ						82611,97				140,28
Раздел: 3. ВЛИ-0,4 кВ										
Демонтаж										
33	ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт)	8	772,5 153,84	618,66 116,37	6180	1230,72	4949,28 930,96	0,9315	7,45
34	ФЕР33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (шт)	4	3101,04 501,06	2599,98 532,67	12404,16	2004,24	10399,92 2130,68	3,036	12,14
35	ФЕР33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт)	16	541,03 222,7	318,33 88,32	8656,48	3563,2	5093,28 1413,12	1,4605	23,37
монтажные работы										

36	ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт)	3		520,24 75,14	445,1 135,63	1560,72	225,42	1335,3 406,89	0,506	1,52
37	ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт)	1		149,81 42,7	107,11 39,56	149,81	42,7	107,11 39,56	0,2875	0,29
38	ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт)	1		173,67 51,28	122,39 45,21	173,67	51,28	122,39 45,21	0,345	0,35
39	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт)	1		2592,19 880,89	1465,92 294,33	2592,19	880,89	1465,92 294,33	5,4625	5,46
40	ФЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт)	1		5529,8 1831,11	3453,31 685,98	5529,8	1831,11	3453,31 685,98	11,3562	11,36
41	ФЕРм08-02-149-01	СИП подвешиваемый на тросе (100 м)	9,53		14467,09 2225,37	12241,72 2504,72	137871,37	21207,78	116663,59 23869,98	12,7105	121,13
Заземление опор ВЛ 0,4 кВ, 2 шт											
42	ФЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (шт)	2		1245,87 143,37	1100,84 128,51	2491,74	286,74	2201,68 257,02	0,9315	1,86
43	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3)	0,0006		25141,12 25141,12		15,08	15,08		177,1	0,11
44	ФЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт)	2		147,89 120,35	25,88	295,78	240,7	51,76	0,782	1,56
45	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3)	0,0006		13892,29 13892,29		8,34	8,34		101,775	0,06
Итого по разделу 3 ВЛ 0,4 кВ							277408,07				186,66
Раздел 4. ПНР											
ВЛ-10 кВ											
46	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта (измерение)	28		755,12 755,12		21143,36	21143,36		3,24	90,72
47	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение)	25		284,28 284,28		7107	7107		1,22	30,5

Гранд-СМЕТА

48	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение)	3	377,65 377,65		1132,95	1132,95		1,62	4,86
49	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений)	0,28	3020,29 3020,29		845,68	845,68		12,96	3,63
50	ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт)	3	1200,11 1200,11		3600,33	3600,33		5,4	16,2
51	ФЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание)	9	624,44 624,44		5619,96	5619,96		2,83	25,47
52	ФЕРп01-11-021-02	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ (измерение)	12	377,65 377,65		4531,8	4531,8		1,62	19,44
53	ФЕРп01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (измерение)	12	18,75 18,75		225	225		0,08	0,96
54	ФЕРп01-11-027-01	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (измерение)	6	377,65 377,65		2265,9	2265,9		1,62	9,72
ВЛИ 0,4 кВ										
55	ФЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта (измерение)	2	755,12 755,12		1510,24	1510,24		3,24	6,48
56	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение)	2	284,28 284,28		568,56	568,56		1,22	2,44
57	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений)	0,02	3020,29 3020,29		60,41	60,41		12,96	0,26
КЛ 10 кВ										
58	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (шт)	1	377,65 377,65		377,65	377,65		1,62	1,62
59	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание)	3	1013,92 1013,92		3041,76	3041,76		4,86	14,58
60	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений)	0,02	3020,29 3020,29		60,41	60,41		12,96	0,26
Итого по разделу 4 ПНР							106786,57			227,14
Раздел 5. Затраты на материалы										

Гранд-СМЕТА

Электрооборудование

61	Цена поставщика	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 (шт.)	3	6729,45	20188,35		
62	Цена поставщика	Разрядник квентильный РВО-10 (шт.)	6	819,62	4917,72		
63	Цена поставщика	Пункт коммерческого учета ПКУ с монтажным комплектом (шт.)	1	243000	243000		
Кабельные изделия. Провода							
64	Цена поставщика	Провод АС 50/8 (м)	1132	34,11	38612,52		
65	Цена поставщика	Провод СИП-2 3х70+1х95 (м)	759	298,01	226189,59		
66	Цена поставщика	Провод СИП-4 2х16 (м)	194	24,44	4741,36		
67	Цена поставщика	Кабель силовой ААБ2п-10 3х50 (м)	95	525,3	49903,5		
68	Цена поставщика	Муфта кабельная концевая наружной установки ЗКНТп-10 35/50 (шт.)	2	2187,92	4375,84		
Железобетонные элементы							
69	ФССЦ-05.1.02.07-0070	Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт)	44	8417,55	370372,2		
70	Цена поставщика	Стойка железобетонная, СВ-95-3 (шт.)	3	6139,83	18419,49		
Изоляторы. Линейная арматура							
71	Цена поставщика	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20-Г (шт.)	97	251,44	24389,68		
72	Цена поставщика	Изолятор подвесной ПС-70Е (шт.)	72	523,35	37681,2		
73	Цена поставщика	Колпачок К6 (шт.)	84	5,95	499,8		
74	Цена поставщика	Колпачок К9 (шт.)	18	8,69	156,42		
75	Цена поставщика	Зажим ПС-2-1 (шт.)	49	50,87	2492,63		
76	Цена поставщика	Зажимы ПА-2-2 (шт.)	108	43,86	4736,88		
77	Цена поставщика	Зажимы ПС-3-1 (шт.)	2	94,53	189,06		

78	Цена поставщика	Ушко однолапчатое У1-7-16 (шт.)	36	178,4		6422,4		
79	Цена поставщика	Промежуточное звено ПРТ-7 (шт.)	36	77,24		2780,64		
80	Цена поставщика	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 (шт.)	36	261,92		9429,12		
81	Цена поставщика	Зажим аппаратный А2А-50-8 (шт.)	18	98,43		1771,74		
82	Цена поставщика	Зажим аппаратный А1А-50-8 (шт.)	6	76,99		461,94		
83	Цена поставщика	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F207 (шт.)	9	29,24		263,16		
84	Цена поставщика	Бугель NB20 (шт.)	9	22,51		202,59		
85	Цена поставщика	Зажим поддерживающий PS2000 (шт.)	9	458,61		4127,49		
86	Цена поставщика	Крюк КГ1 (шт.)	2	204,39		408,78		
87	Цена поставщика	Зажим поддерживающий ПН1 (шт.)	2	263,14		526,28		
88	Цена поставщика	Зажими натяжной НЦ25 (шт.)	3	322,58		967,74		
89	Цена поставщика	Зажим отсечения фазы ОК1-2 (шт.)	3	190,04		570,12		
90	Цена поставщика	Зажим ответвительный ОН1-2 (шт.)	3	200,76		602,28		
91	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА 16 (шт.)	13	37,68		489,84		
92	Цена поставщика	Натяжной зажим DN123 для СИП-4 2*16 (шт.)	16	109,44		1751,04		
93	Цена поставщика	Зажим Р645 (шт.)	32	154,21		4934,72		
94	Цена поставщика	Натяжной зажим РА2200 для СИП-2 39*70+1*95 (шт.)	24	984,38		23625,12		
95	Цена поставщика	Зажим Р72 для ЗП6 (шт.)	28	291,25		8155		
96	Цена поставщика	Плоскочный зажим CD35 (шт.)	42	93,15		3912,3		
97	Цена поставщика	Стяжной хомут Е778 для СИП-2 3х70+1х95 (шт.)	88	7,54		663,52		
98	Цена поставщика	Зажим соединительный MJRT 70.35 (шт.)	4	387,63		1550,52		
99	Цена поставщика	Зажим соединительный MJRT 70.50 (шт.)	12	565,8		6789,6		
100	Цена поставщика	Зажим соединительный MJRT 70 (шт.)	3	225,13		675,39		

Гранд-МЕТА

101	Цена поставщика	Зажим соединительный MJRT 95.50 (шт.)	4	426,39				1705,56		
102	Цена поставщика	Зажим соединительный MJRT 95.70 (шт.)	1	645,73				645,73		
Стальные конструкции										
103	Цена поставщика	Оттяжка OT4 (шт.)	2	5457,63				10915,26		
104	Цена поставщика	Стяжка OT5 (шт.)	2	2806,03				5612,06		
105	Цена поставщика	Траверса TM2 (шт.)	2	1169,49				2338,98		
106	Цена поставщика	Траверса TM3 (шт.)	6	1705,51				10233,06		
107	Цена поставщика	Траверса TM5 (шт.)	3	1301,8				3905,4		
108	Цена поставщика	Траверса TM6 (шт.)	5	2284,17				11420,85		
109	Цена поставщика	Траверса TM73 (шт.)	5	1868,77				9343,85		
110	Цена поставщика	Траверса TM60a (шт.)	5	345,77				1728,85		
111	Цена поставщика	Оголовок OG1 (шт.)	3	705,54				2116,62		
112	Цена поставщика	Оголовок OG55 (шт.)	4	199,87				799,48		
113	Цена поставщика	Оголовок OG59 (шт.)	4	2111,64				8446,56		
114	Цена поставщика	Накладка OG2 (шт.)	10	240,48				2404,8		
115	Цена поставщика	Накладка OG5 (шт.)	5	93,02				465,1		
116	Цена поставщика	Хомут X1 (шт.)	26	107,2				2787,2		
117	Цена поставщика	Хомут X2 (шт.)	3	106,46				319,38		
118	Цена поставщика	Хомут X7 (шт.)	12	62,1				745,2		
119	Цена поставщика	Хомут X8 (шт.)	6	62,1				372,6		
120	Цена поставщика	Хомут X9 (шт.)	2	64,49				128,98		
121	Цена поставщика	Хомут X23 (шт.)	2	65,87				131,74		
122	Цена поставщика	Накладка OG52 (шт.)	5	147,47				737,35		

Гранд-СМЕТА

123	Цена поставщика	Кронштейн У1 (шт.)	16	147,47	2359,52		
124	Цена поставщика	Кронштейн У2 (шт.)	5	1507,33	7536,65		
125	Цена поставщика	Лист 1*210*280 (шт)	9	394,45	3550,05		
126	Цена поставщика	Кронштейн РА1 (шт.)	3	1112,97	3338,91		
127	Цена поставщика	Кронштейн РА2 (шт.)	3	161,39	484,17		
128	Цена поставщика	Кронштейн РА4 (шт.)	4	128,64	514,56		
129	Цена поставщика	Кронштейн РА5 (шт.)	4	128,64	514,56		
130	Цена поставщика	Кронштейн Р1 (шт.)	3	1035,59	3106,77		
131	Цена поставщика	Кронштейн Р2 (шт.)	3	297,25	891,75		
132	Цена поставщика	Кронштейн КМ1 (шт.)	2	230	460		
133	Цена поставщика	Вал привода РА3 (шт.)	6	1022,33	6133,98		
134	Цена поставщика	Проводник ЗП1 (м)	36,4	72,85	2651,74		
135	Цена поставщика	Проводник ЗП6 (м)	21,5	89,36	1921,24		
136	Цена поставщика	Кронштейн У4 (шт.)	1	1646,94	1646,94		
137	Цена поставщика	Уголок 80х80х6 L=2300 (м)	4,6	406,4	1869,44		
138	Цена поставщика	Круг 10 (т.)	0,006468	41711,86	269,79		
139	Цена поставщика	Заземляющий проводник МГГ (шт.)	2	172,62	345,24		
140	Цена поставщика	Проволочная вязка (м)	35	125,72	4400,2		
141	Цена поставщика	Наконечник 7-8 (шт.)	4	16,76	67,04		
142	Цена поставщика	Скоба КМ3 (шт.)	7	78,94	552,58		
143	Цена поставщика	Болт Б5 (шт.)	5	205,64	1028,2		
144	Цена поставщика	Хомут Х12 (шт.)	13	127,08	1652,04		
145	Цена поставщика	Хомут Х33 (шт.)	15	172,62	2589,3		

Гранд-СМЕТА

146	Цена поставщика	Траверса ТН18 (шт.)	13	285,81			3715,53		
147	Цена поставщика	Траверса ТМ46 (шт.)	15	394,29			5914,35		
Материалы									
148	Цена поставщика	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d=18 (м)	286	76,02			21741,72		
149	Цена поставщика	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый d=12 (м)	300,6	35,08			10545,05		
150	Цена поставщика	Эмаль ПФ-115 (белого цвета) (кг)	0,153	97,46			14,91		
151	Цена поставщика	Эмаль ПФ-115 (черного цвета) (кг)	3,27	97,46			318,69		
152	Цена поставщика	Грунтовка ГФ-021 (кг)	0,081	97,46			7,89		
153	Цена поставщика	Труба полиэтиленовая d=110 мм с толщиной стенки 6,5 мм (м)	68	164,09			11158,12		
154	Цена поставщика	Кирпич строительный (полнотелый) М-100 (шт.)	42	5,46			229,32		
155	Цена поставщика	Пена монтажная "Soudafoam FR" 750 мл. (шт.)	2	204,66			409,32		
156	Цена поставщика	Песок (т)	18,292	389,83			7130,77		
Стандартные изделия									
157	Цена поставщика	Болт М12*40 (шт)	33	8,05			265,65		
158	Цена поставщика	Гайка М12 (шт)	33	6,1			201,3		
159	Цена поставщика	Шайба 12 (шт)	33	10,58			349,14		
160	Цена поставщика	Болт М8*60 (шт)	6	12,65			75,9		
161	Цена поставщика	Гайка М8 (шт)	6	2,65			15,9		
162	Цена поставщика	Шайба 8 (шт)	6	0,64			3,84		
163	Цена поставщика	Болт Б1 (шт.)	1	146,24			146,24		
164	Цена поставщика	Шайба пружинная 8Н,8 (шт)	3	62,13			186,39		
Итого по разделу 5 Затраты на материалы							1319566,88		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1 969 313,50	241985,62	386039,76 78365,84	1407,03
Накладные расходы	301 769,79			
Сметная прибыль	181 799,50			
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	1 123 843,79			936,76
Итого Монтажные работы	954 144,36			243,13
Итого Оборудование	268 106,07			
Итого Прочие затраты	106 786,57			227,14
Итого	2 452 882,79			1407,03
В том числе:				
Материалы	1 073 182,05			
Машины и механизмы	386 039,76			
ФОТ	320 351,46			
Оборудование	268 106,07			
Накладные расходы	301 769,79			
Сметная прибыль	181 799,50			
ВСЕГО по смете	2 452 882,79			1407,03

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2018 г.

_____ 2018 г.

НСО, Колыванский район, кадастровый номер земельного участка 54:10:026001:1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на МТП 160кВА на объекте: СНТ "Надежда"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 415 534,80 руб.
Средства на оплату труда _____ 20 705,65 руб.
Сметная трудоемкость _____ 107,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	11
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2)	0,02	19095,26 19095,26			381,91	381,91		123	2,46	
2	ФЕР01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3)	0,01	42399,45 42399,45			423,99	423,99		278	2,78	
3	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,24	8200,33 2839,93	545,25 100,46		1968,08	681,58	130,86 24,11	16,6	3,98	

Гранд-СМЕТА

4	ФССЦ-08.3.07.01-0042	Сталь полосовая: 40x4 мм, кипящая (т)	0,03024	33356	1008,69				
5	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм (10 шт)	0,8	4849,95 1830,56	3879,96	1464,45	324,46 69,45	10,7	8,56
6	ФССЦ-08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3сп2, размером 50x50x5 мм (т)	0,0754	31004,94	2337,77				
7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2 (100 м3)	0,01	13267,8 13267,8	132,68	132,68		97,2	0,97
8	ФЕР33-04-027-03	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А.; установка строительных конструкций (шт)	1	2705,97 649,92	2705,97	649,92	2039,37 367,28	4,03	4,03
9	ФЕР33-04-027-04	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А.; установка оборудования (шт)	1	14435,03 11326,41	14435,03	11326,41	3108,62 812,08	65,44	65,44
10	ФССЦ-05.1.02.07-0070	Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1- 143; 3.407.1-136) (шт)	2	8417,55	16835,1				
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы					70572,63				88,22

Раздел 2. ПНР

11	ФЕРп01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (шт)	1	1486,21 1486,21	1486,21	1486,21		6,3	6,3
12	ФЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (шт)	1	461,73 461,73	461,73	461,73		2,7	2,7
13	ФЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение)	1	377,65 377,65	377,65	377,65		1,62	1,62
14	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений)	0,02	3020,29 3020,29	60,41	60,41		12,96	0,26
15	ФЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (шт)	3	191,1 191,1	573,3	573,3		0,82	2,46
16	ФЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение)	3	470,83 470,83	1412,49	1412,49		2,02	6,06

Гранд-СМЕТА

Итого по разделу 2 ПНР

Раздел 3. Оборудование и материалы

17	Цена поставщика	МТП 160/10/0,4 (1 шт)	1	336000				
О								
Итого по разделу 3 Оборудование и материалы								
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				384 480,97	19432,73	5603,31 1272,92	107,62	
Накладные расходы				19 533,61				
Сметная прибыль				11 520,22				
Итого по смете:				40 959,69			75,68	
Итого Строительные работы				29 612,94			12,54	
Итого Монтажные работы				336 000,00				
Итого Оборудование				8 962,17			19,4	
Итого Прочие затраты				415 534,80			107,62	
Итого								
В том числе:				23 444,93				
Материалы				5 603,31				
Машины и механизмы				20 705,65				
ФОТ				336 000,00				
Оборудование				19 533,61				
Накладные расходы				11 520,22				
Сметная прибыль				415 534,80			107,62	
ВСЕГО по смете								

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)
